

SEOUL M! SOUL

주요 업무 보고

2025. 4.




미래한강본부

I. 일반 현황

1 조직인력

조직 1단 7부 20과 11안내센터

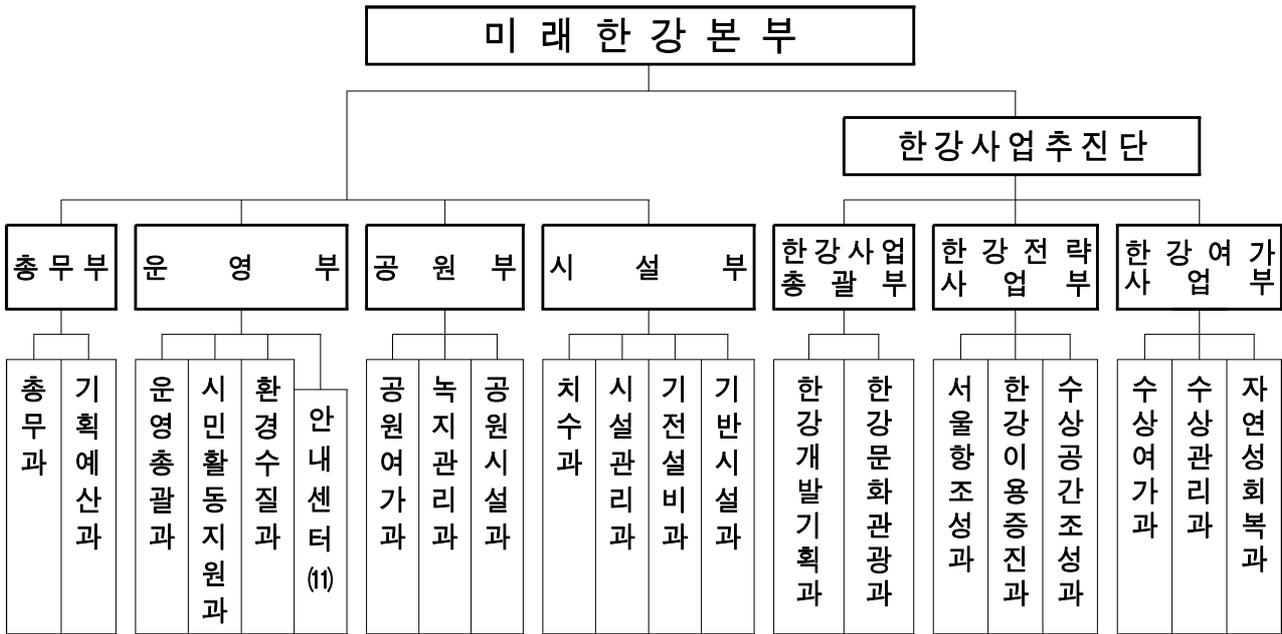

인력

정원/현원 ('25.3.31.기준)

구분	합계	일반직			전문경력관	임기제
		행정직	기술직	관리운영직		
합계	250/255	87/86	148/153	3/5	2/2	10/9
본부	210	59	137	3	2	9
안내센터	45	27	16	2	-	-

※ 현원 미포함자 : 201명(시간선택제 임기제 148명, 공공안전관 53명)

주요업무

부 서	주 요 업 무
총 무 부	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 인사·감사·조직·상훈·교육훈련·급여·후생 및 복무 ◦ 문서·관인·청사·총무계획·보안, 본부 및 안내센터 청사 관리 ◦ 재난·안전 총괄 및 중대재해 예방, 한강공원 CCTV 통합관제센터 운영 ◦ 누리집 운영·전산장비 및 소프트웨어 보급·유지보수 ◦ 세외수입 총괄, 예산·결산 및 계약·지출·물품관리 등 회계 및 재정 ◦ 주요 업무계획 수립 및 성과관리 총괄 ◦ 시의회, 국회 등 대외기관 협력 및 지원 ◦ 예산편성·조정·배정 및 법제사무 업무
운 영 부	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 안내센터 지도·감독·운영 및 공공안전관·한강보안관 운영 ◦ 공원 불법행위·행락질서 지도·단속(과태료) 및 환경순찰 ◦ 매점·전망카페 등 공원 편익시설 관리 ◦ 하천점용허가(장소 사용승인 포함) 및 점용료 부과징수 ◦ 친환경 순환관람차 운영 ◦ 공원 내 화장실 시설 확충 및 유지관리 ◦ 공원 내 둔치·수상 쓰레기 청소 및 수거 처리 ◦ 상수원보호구역·한강수질 관리, 한강 오염원 지도 단속 및 방재 등 ◦ 밤섬(람사르습지), 온실가스·미세먼지 관련 업무 ◦ 한강 자전거 이용 활성화 ◦ 한강공원 자원봉사 운영 및 지원
공 원 부	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공원여가정책 기획 및 시행 ◦ 자연학습·생태프로그램 개발·운영, 생태공원 민간위탁에 관한 사항 ◦ 축구장 등 직영 체육시설 운영 관리 ◦ 테니스장 등 위탁 체육시설 사용수익허가 및 운영관리 ◦ 녹지 및 조경시설의 조성 및 유지관리 ◦ 놀이터, 음수대, 그늘막, 기타체력 단련시설 등 설치·관리 ◦ 녹지 내 병해충 구제 및 예방 ◦ 주차 정책에 관한 사항 ◦ 수영장·주차장·운동시설 등 사용·수익 허가시설 운영·관리 ◦ 캠핑장 민간위탁(매점 사용허가) 운영 및 유지관리

부 서	주 요 업 무
시 설 부	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자전거도로·하천시설물 설치 및 유지관리 ◦ 재난안전대책(풍수해, 제설) 계획수립 및 운영 ◦ 각종 공원 시설물, 접근시설 등 설치 및 유지관리 ◦ 공원 내 기계·전기 설치 및 보수 ◦ 수중보 운영 및 유지관리 ◦ 승강기 및 공원내 분수시설물 운영·유지관리 등
한 강 사업 총괄 부	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 한강 이용 활성화 정책의 총괄 조정·공정 관리 ◦ 한강유역환경청 등 중앙부처·타 지자체 협력체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 한강유역환경청, 경기도, 인천광역시 등 사업별 협력방안 모색 ◦ 한강 문화·관광 분야 축제 및 프로그램 활성화 ◦ 한강공원 홍보 및 언론대응 총괄
한 강 전략 사업 부	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 서울항 조성 및 서해벚길 사업 총괄 <ul style="list-style-type: none"> - 여의도 유람선터미널 조성 및 운영, 서울항 조성 기본계획 및 타당성 조사 ◦ 한강버스 도입·운영 <ul style="list-style-type: none"> - 운항계획 수립, 선착장 조성 및 접근성 개선 등 ◦ 수상·수변 스포츠 및 레저 기반시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 잠실계류장, 수상푸드존, 한강 아트피어 조성 등
한 강 여가 사업 부	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 유선사업·수상레저사업의 인·허가 및 관리 ◦ 수상 이용시설 설치 및 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 서울 수상레포츠센터 운영, 세빛섬·서울마리나 등 인허가 ◦ 부유식 수상구조물, 선박 하천점용허가 및 점용료 부과징수 ◦ 부유식 수상구조물 및 선박 안전관리 ◦ 한강 자연성 회복 분야 사업 총괄 <ul style="list-style-type: none"> - 한강 자연형 호안 사업, 자연형 물놀이장 조성 ◦ 생태공원 복원 및 생물서식 환경 개선

2 세입 및 세출 예산

세입

(단위: 백만원 / %)

구분		2025	2024	전년 대비	
				증감액	증감률
합계		45,884	39,991	5,893	14.7
세외수입		45,884	39,961	5,923	14.8
경상적	소계	42,739	36,442	6,297	17.3
	재산임대수입	35,854	29,186	6,668	22.8
	사용료수입	6,753	7,099	-346	-4.9
	수수료수입	118	151	-33	-21.9
	이자수입	14	6	8	133.3
임시적	소계	1,266	1,529	-263	-17.2
	기타수입	1,266	1,529	-263	-17.2
지방행 정제재· 부과금	소계	529	463	66	14.3
	변상금	196	219	-23	-10.5
	과태료	333	244	89	36.5
지난 연도	소계	1,349	1,527	-178	-11.7
	지난연도수입	1,349	1,527	-178	-11.7
보전수입등및내부거래		-	30	-30	-100.0
보전 수입등	전년도이월금	-	30	-30	-100.0

세출

(단위: 백만원 / %)

구분		2025	2024	전년 대비		총예산 대비비율
				증감액	증감률	
합계		128,632	150,686	-22,054	-14.6	100.0
행정운영경비		2,566	2,382	184	7.7	2.0
사업비		126,066	148,304	-22,238	-15.0	98.1
일반	한강공원시설관리개선	84,853	66,379	18,474	27.8	66.0
	시민중심한강문화활성화	6,722	5,927	795	13.4	5.2
	하천시설관리	17,631	63,434	-45,803	-72.2	13.7
	접근체계개선	8,600	2,988	5,612	187.8	6.7
	생태계회복	35	102	-67	-65.7	0.1
	한강공원홍보	1,071	1,217	-146	-12.0	0.8
	자연성회복	7,032	4,034	2,998	74.3	5.5
	관광자원화	122	123	-1	-0.8	0.1
특별	접근체계개선	-	4,100	-4,100	-100.0	-

II. 정책비전 및 목표



1. 글로벌 수상 명소 한 강

① 한강버스 도입 및 운영

② 여의도 유람선터미널 조성

③ 잠실 계류장 조성

④ 한강공원 수경시설 운영

1

한강버스 도입 및 운영

새로운 수상교통수단인 한강버스 도입으로 시민들의 교통편의를 증진하고 새로운 관광자원으로 활용하여 글로벌 도시경쟁력 강화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업구간 : 김포대교 ~ 잠실대교 31.5km
- 사업규모 : 선착장 7개소, 선박 12척(예비선박 2척 포함)
 - 선착장 위치 : 잠실, 뚝섬, 옥수, 압구정, 여의도, 망원, 마곡
- 선박제원 : 35.5m×9.5m, 169톤, 평균 31.5km/h(17노트), 친환경 선박
 - 155~199인승, 좌석별 테이블, 자전거 거치대(20대), 휠체어석, 카페테리아 등
- 사업비 : 재정 227억 / 민간 1,333억
- 운영주체 : (주)한강버스(SH공사 51%, 이크루즈 49%)

□ 운영계획

- 이용요금 : 일반 3,000원(환승할인 적용 및 기후동행카드 도입 예정)
- 운항노선 : 7개 선착장(마곡⇄잠실, 양방향 편도), 급행(마곡⇄여의도⇄잠실) 포함
- 운항시간
 - 평일 68항차 / 06:30(출발지) ~ 22:30(도착지) / 출퇴근 15분, 그 외 30분 간격
 - 주말 48항차 / 09:30(출발지) ~ 22:30(도착지) / 30분 간격
 - ※ 상반기 중 안전운항 테스트 후 최종 운항시간 확정 및 단계적 운항 개시 예정

□ 추진현황

- (선박 건조) 1·2호선 '25.2.27 한강 인도 완료, 잔여 10척은 2개 조선소(은성·가덕중공업)에서 건조 중
 - 선박 감독단(4명, (주)한강버스 고용)이 현장에 상주하면서 적극 공정 관리 중으로, 순차적으로 적기 인도 추진

작성 자

한강전략사업부장: 진재섭 ☎ 3780-0870 한강이용증진과장: 이진오 ☎ 0661 담당: 박용운 ☎ 0663

- (선착장) 선착장 및 상부 건축물 공사(건축, 전기·소방·통신) 병행 추진 중으로 '25. 4월 중 공사 완료 예정



<여의도 선착장>



<잠실 선착장>



<옥수 선착장>

- (부대사업) 업체 선정 완료 후 인테리어 공사 중으로 4월부터 순차적 영업 개시
 - 1층: 편의점(7개), 2층: 치킨 Pub(5개), 3층: 특색 있는 카페 입점 예정
- (안전관리) 한강버스 항로(안)에 따라 교량 시설 항로표지 이·증설 착수(3월) 교량 통과 안전을 위한 교량 충돌 방지 표지 등 설치 예정(4월)

□ 소음저감 대책

- (지적사항) 상임위 선박 탑승('25.3.5.) 시 소음 발생으로 저감 대책 마련 필요
- (소음원인) 객실 좌석 확보 및 잠수교 통한 위한 낮은 선체 등으로 인해 발전기실과 여객실의 물리적 이격거리 한계로 소음 발생
 - 측정결과 : 1호선 여객실 69dB(선수)~79dB(선미), 2호선 여객실 69dB(선수)~77dB(선미)
 - ※ 측정: '25.2.12., (주)HD 현대이엔티(울산지방해양수산청 지정 선내소음계측기관)
- (조치계획) 소음발생 주원인인 발전기실에 흡음재 설치하고 기관실 출입 해치(개구부)의 밀폐성 점검 및 덮개 설치 등을 통해 소음저감
 - 소음저감 전문업체 총 4개사에서 소음측정 및 현장답사 실시
 - ▶ 3.13.~3.14. 현장답사, 3.14.~3.27. 소음측정 및 흡음재 성능 시연 등
 - 전문업체 검토결과 및 소음저감 방안에 대해 협의 및 검토 후 설치 추진

□ 향후계획

- '25. 4.~ : 선착장 및 부대시설 조성 공사 완료
- '25. 상반기~ : 한강버스 운항 개시

2

여의도 유람선터미널 조성

서해벚길 시대 개막의 중추적 역할을 담당할 여의도 유람선터미널 추진으로 경인아라벚길 운항 및 지역 경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 한강의 국제적 위상 강화 및 관광 거점화를 위한 서해벚길 조성 사업
 - 국내외 여행수요 및 對중국관계 등 여건 변화를 고려하여 단계적 추진

1단계 경인아라벚길 운항 활성화(유람선터미널) > **2단계** 서해벚길 운항 기반 마련(서울항)

시 설 개 요

- (위 치) 서울항 항만구역 내
- (규 모) 상부(시설물) 연면적 3,599㎡ (3층)
하부(부잔교) 3,468㎡ (102m×34m)
- (사업비) 300억원(민간)
- (개 항) '25년 연 1천 회 이상 운항



□ 추진경과

- '23. 2. : 선착장 조성 및 운영사업자 공모(~3.21)
- '23. 5. : 협약 체결(본부(주)한강포레크루즈)
- '24. 12. : 조성기간 연장('24. 12. → '25. 5.)
 - 기상 현황, 작업인력 확보 어려움 등으로 인한 공정 지연
- '25. 4. : 상부체 기계설비 공사 진행 중 ※ 공정률 : 하부체 99%, 상부체 65%



< 공사장 전경 >




< 층별 기계설비 공사 진행 중 >

작성 자

한강전략사업부장:진재섭 ☎3780-0870 서울항조성과장:이민재 ☎0636 담당:안태호 ☎0637 권다혜 ☎0639

□ 현안사항

- (공정 관리) 적기 준공을 위해 주1회 공정점검 현장회의 등 적극 공정 관리 중이며 사업자 또한 5월 터미널 준공에 의지를 가지고 노력 중임
 - 1층(1,067㎡) 선 준공을 통해 유람선 개항일을 최대한 앞당길 수 있도록 추진
 - ※ [1층] 매표소, 승객대기실, 편의시설 등, [2층] F&B, [3층] 컨벤션홀, 사무실 등
 - 기타 편의시설(2,3층)은 공사완료 후 입점시설 확정하여 내부 인테리어 완료 후 개점 예정
- (안전성 강화) 도교지지 방식에 앵커-체인 추가하여 안전성 2배로 강화 예정
 - 도교 파손 시 앵커-체인만으로도 부선 지지 가능(부선 유실에 따른 2차 사고 방지)
 - 체인 하중 및 앵커의 지지력으로 부선의 상·하류 방향 변위를 제어하여 도교(연결부위)에 발생하는 부하 저감 효과

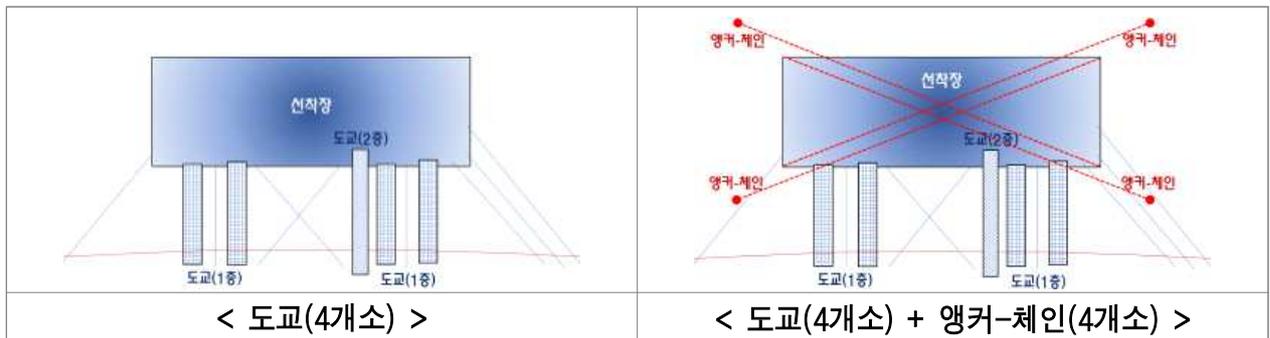

- (공공성 확보) 과도한 이익 발생 우려 대비 공공기여 방안 마련 및 협약변경 협의
 - 한강관광 활성화 기반시설 확충 및 관광 약자와의 동행 지원 등에 수익금 일부 기여 예정
 - 초과운영수익 공유 방안에 대한 기준 마련하여 준공 전까지 협약변경 예정

□ 향후계획

- '25. 4. : 이중 안전장치(체인앵커) 제작
- '25. 5. : 유람선터미널 준공

3

잠실계류장 조성

한강 내 부족한 계류장을 확충하고, 한강 수변 명소화 및 관광거점 조성을 위해 잠실지역에 거점형 계류장을 조성하고자 함

□ 사업개요

- ▶ 위치 잠실한강공원 내 수역(61,242㎡)
- ▶ 시설 계류장(220선석), 클럽하우스(3층) 플로팅파크, 스테이션박(50척) 등
- ▶ 사업자 한강마리나(주)
- ▶ 사업비 750억 원 (공유재산법에 의한 기부채납)
- ▶ 기간 '27. 6월까지 준공



□ 추진현황

- '24. 4.18. : 사업계획 수립
- '24. 5.28. : 사업자 공개모집 및 제안서 평가
- '24. 8.14. : 협약체결(미래한강본부&한강마리나(주))
- '24. 9.24. : 공유재산심의(시설물 기부채납, 조건부 적정)
- '24.11.21. : 공공디자인진흥위원회 심의(조건부 동의)
- '24.12.31. : 소규모 환경영향평가서 반려(한강유역환경청)
 - 사유 : 사업규모 과다, 하천 흐름에 지장 우려, 생태계 및 수질오염 우려 등
- 3차('25.1.17./2.14./3.5.) 실무협의 : 한강유역환경청
 - 유역청 의견 : 사업규모 및 위치 부적정, 오수시설은 파손 위험으로 반영 제한
- '25. 3.~ : **사업규모 축소(안) 마련 및 협의 추진 중**
 - 사업규모: 61,242 → 49,694㎡, 오수처리장치: 100 → 26개, 계류선석: 220 → 150석

□ 향후계획

- '25. 4. : 소규모 환경영향평가 협의 재접수
- '25. 5. : 하천점용허가 및 공사착수(공기 : '25. 6.~'27. 6.)

4

한강공원 수경시설 운영

한강공원을 방문하는 시민들에게 한강 수경시설(11개소) 운영을 통해 볼거리·즐길거리를 제공하고자 함

□ 운영개요

- 운영대상 : 한강공원 수경시설 11개소
- 운영기간 : '25. 4. 1. ~ '25. 10. 31.(7개월)

분 수 명	운영기간
(반포) 달빛무지개분수 (뚝섬) 음악분수 (여의도) 물빛광장	4. 1. ~ 10. 31.
(뚝섬) 벽천분수, 조형물분수 (난지) 거울분수 (여의도) 수상분수, 안개분수 (이촌) 벽천분수	5. 1. ~ 10. 31.
(뚝섬) 물보라극장 (난지) 물놀이장분수	7. 1. ~ 8. 31.

□ 추진현황

- '25. 3. : 한강공원 수경시설 운영 전 사전점검 및 수리
 - 분수 가동전 정밀점검, 조명등 수리, 운영시스템 개선 등 점검
 - 미비사항 조치 후 최종 작동점검



< 시험작동 점검 >



< 분수 노즐 등 시설물 점검 >

□ 향후계획

- '25. 4.~10. : 수경시설 운영
- '25. 4.~12. : 수질관리 및 전기시설 등 유지보수 시행

작성 자

시설부장: 이유국 ☎ 3780-0830 기반시설과장: 정현석 ☎ 0675 담당: 권용재, 장은석 ☎ 0628

2. 문화예술 매력공간 한 강

- ① 잠실마루 전망쉼터 작은도서관 조성
- ② 여의도 물빛무대 시민개방 확대
- ③ 뚝섬 자벌레 가족친화형 공간으로 개선
- ④ 광진교 8번가 명소화 추진

1

잠실마루 전망쉼터 작은도서관 조성

공실인 잠실대교 전망쉼터(잠실마루)를 한강의 전망과 함께 시민들이 힐링할 수 있는 작은 책방 컨셉으로 리모델링하여 한강의 명소로 조성하고자 함

□ 사업개요

- 목 적 : '잠실대교 전망쉼터'를 '작은 도서관'으로 리모델링 및 운영활성화
- 위 치 : 잠실대교 남단 상류 승강기타워 3·4층(76㎡)
- 소요예산 : 218백만원

※ 송파구청에서 문화시설로 사용하였으나, 2021년 반납 후 현재는 공실 상태
- 상수원보호구역에 위치하여 사용 용도가 제한됨(문화 및 집회시설)

□ 추진방향

- 한강을 조망하며 휴식과 함께 독서할 수 있는 개방형 도서관 조성
 - 한강 조망과 도서 진열, 독서 공간이 균형을 이루는 개방형 공간으로 조성
 - 모든 연령층이 이용할 수 있도록 도서 구비
- 「책읽는 한강공원」 행사 연계 등 다양한 프로그램 운영



< 실내 전경 리모델링(안) >



< 독서 공간 리모델링(안) >

□ 향후계획

- '25. 4.~6. : 전문가 자문회의, 리모델링 실시설계
- '25. 7.~12. : 리모델링 공사 발주·진행, 세부 운영계획 수립
- '26. 상반기 : 잠실대교 작은 도서관 운영 개시

작 성 자 운영부장: 정현석 ☎ 3780-0801 운영총괄과장: 박태수 ☎ 0804 담당: 하인식 ☎ 0813

2

여의도 물빛무대 시민개방 확대

무대 자체로만 인식되고 공연시설물 설치 장소로 사용되던 물빛무대를 개선하고 내부 공간을 시민들에게 개방 확대하여 활용도를 제고하고자 함

추진방향

- (시설개선) 실내에도 좌석을 마련하고 이동식 상설무대를 설치하여 무대 내·외부 어디에서나 공연진과 관객 간 활발한 소통 유도
- (시민 참여 확대) 시민이 직접 공연하거나 참여할 수 있는 프로그램을 운영하여 여의도 물빛무대를 시민친화형 문화시설로 자리매김

주요 시설 개선사항

- (개 폐 문) 열리지 않던 한강 방향 개폐문을 수리하여 개방감↑, 밤섬 조망
- (무 대) 내부 무대 설치하고 무대 양 옆에 대형 LED 배치, 트러스 및 조명 완비
- (기 타) 실내외 도장도색, 공연진 대기실 환경 개선, 관람 의자 100석 마련 등



< 무대 및 LED 대형 화면 >



< 개폐문 수리 후 밤섬 조망 >



< 공연진 대기실 정비 >

운영 개선방안

- (기존) 기업·단체·공공 대관 중심 ⇒ (개선) 시민 모두에게 열린 공간
- 실력 있는 예술가 누구나 공연을 진행(토·일)하고 유튜브 등 SNS(본인·본부)에 게재 후 반응이 좋은 아티스트들로 10월 왕중왕을 겨루는 'My First Stage'
- 특별한 결혼식 위한 '수상 웨딩홀', 음악감상실·밤섬 '멍존' 운영(공연 미개최시) 등
※4월 시범운영 후 대행사 선정

향후계획

- '25. 4.~10. : 시민 개방 프로그램 운영

작성 자

한강사업총괄부장: 이응창 ☎ 3780-0865 한강문화관광과장: 이강수 ☎ 0765 담당: 김유정, 강문규 ☎ 0764, 0758

3

독심 자벌레 가족친화형 공간으로 개선

노후된 독심 자벌레 1·3층에 미디어아트와 같은 트렌디한 체험 공간을 조성하여 2층 키즈카페와 연계, 가족친화형 명소로 활성화하고자 함

추진배경

- 도심·지하철역과 한강이 직접 연결된 독특한 건축물로 한강 둔치에 조성되었으나, 수익시설에서 공유오피스로 변경 등 **공간 정체성 혼란**
- 현재 한강이야기전시관 및 키즈카페를 운영 중이나, **그간 내부 시설 개선이 미흡하여 1, 3층 활용도 제고 필요**

추진방향

- **어린이 체험·교육 공간, 미디어아트존** 등 관람객 수요를 충족할 수 있는 다양한 전시 공간을 마련, **창의적 문화공간으로 정체성 강화**
- 2층 키즈카페(이용 연령 0~6세)와 연계하여 **초등학생을 포함한 가족 단위 이용객 대상 새로운 한강의 핫플레이스로 조성 및 기존 노후시설 개선**

추진현황



- '24. 9.~11. : 마스터플랜 마련
 - 건축물 공간 현황 분석, 공간 조성 기본계획 및 설계 방향 수립 완료
- '24. 11.~'25. 5. : 기본 및 실시설계 용역 중
 - 어린이를 포함한 가족친화적 공간 조성을 위하여 **테마별 공간을 구성하고, 그에 맞는 공간디자인(사인, 바닥패턴, 천장, 조명 등) 및 물품(놀이기구, 전시물 등)으로 전체적인 설계 시행 중**

향후계획

- '25. 4.~8. : 실내공사(전기, 소방, 통신공사 포함) 및 감리
- '25. 5.~10. : 놀이기구 및 물품 제작, 완공

작성 자

한강사업총괄부: 이응창 ☎ 3780-0865 한강문화관광과장: 이강수 ☎ 0765 담당: 이준용 ☎ 0776

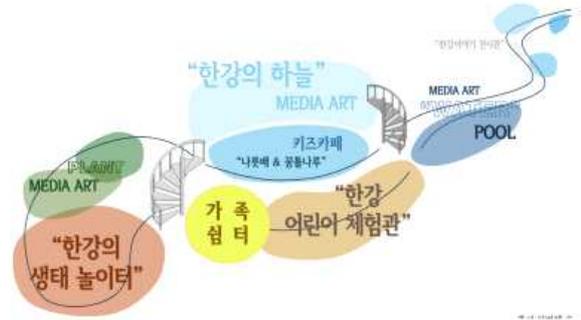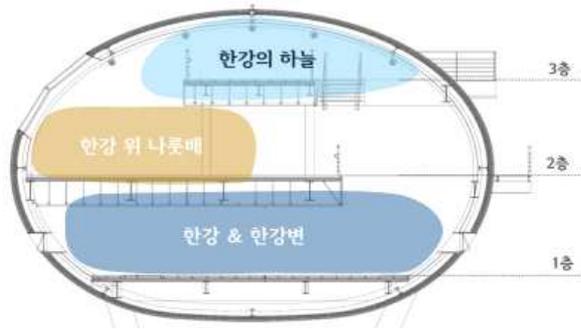

< 층별 콘셉트 >

< 동선에 따른 콘셉트 >



(1층) < WATER POOL >



(1층) < 한강 어린이 체험관 >

(1층) < 가족 쉼터 >



(1층) < 한강의 생태 놀이터 >



(3층) < 한강의 하늘 >

4

광진교 8번가 명소화 추진

최근 4년 사이 방문객 수가 10배 이상 증가하며 핫플레이스로 자리매김한 광진교 8번가를 명소화하여 세계적 전망 명소로 조성하고자 함

□ 추진방향

- 최근 입소문을 타며 핫플레이스로 자리매김한 광진교 8번가를 연 5만명 이상 방문하는 세계적 전망 명소로 조성
- '09년 준공 이래 16년이 지난 노후화된 시설을 최신 트렌드에 맞게 개선하여 국내 방문객을 비롯한 외국 관광객에게 쾌적하고 이색적인 공간 제공

• 연도별 방문객 추이(2020년~2024년)

연도	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
방문객(명)	1,220	3,542	7,201	15,369	33,183

□ 추진현황

- (라운지 공간확장) 활용도가 저조한 공연장을 '라운지 공간'으로 조성('25. 3.)
 - 활용도가 4%에 불과했던 공연장을 라운지로 조성하여 방문객 수용 공간 확장
- (시설 전면 보수 및 개선) 쾌적한 공간 마련으로 '방문객 편의 제고'('25. 3.)
 - 기존 복잡했던 라운지를 리모델링하여 아늑한 카페 콘셉트 공간으로 조성
 - 천장 보수, 외부 기둥 녹 제거 및 정문 도색, 조명 교체 등 노후화된 시설 전면 보수

□ 향후계획

- '25. 하반기 : 운영시간 확대 및 다양한 문화체험 공간 조성
 - 예시 : 새벽 요가교실, 야간 실내 캠핑 체험존 등

작성 자

한강사업총괄부: 이응창 ☎ 3780-0865 한강문화관광과장: 이강수 ☎ 0765 담당: 이준용 ☎ 0776



◆ 천공형 천장(적정온도 유지 어려움, 소음·분진 발생)을 단열, 차음이 가능하도록 리모델링, 조명등 설치



◆ 기존 복잡했던 라운지를 의자 및 탁자 설치, 도색 등 전체적으로 리모델링하여 쾌적한 실내환경 조성



◆ 활용도가 저조한 공연장(전체 방문자 수 대비 4%)을 전체적으로 리모델링하여 라운지 공간으로 조성



◆ 외부 기둥 녹제거 및 도색, 정문 도색, 계단 조명등 교체 등 노후화된 시설 전체적으로 보수

3. 자연친화 여가공간 한강

① 한강 생태공원 재정비

② 중랑천 놀빛광장 조성

③ 한강 맨발걷기길 조성 · 운영

④ 안양천교 자전거도로 구조개선

1

한강 생태공원 재정비

생물다양성 거점으로서의 생태공원 가치를 제고하고 노후화된 시설 및 공간 정비를 통해 한강 본연의 자연성과 생태기능을 복원·강화하고자 함.

□ 사업개요

- 대상지역 : 한강생태공원 5개소(강서, 여의도샛강, 난지, 고덕, 암사)
- 사업기간 : '23. 1. ~ '26. 12.
- 사업내용 : 생태기능 복원·강화, 노후시설 개선 및 특화공간 조성
- 총사업비 : 13,040백만원('25년 4,300백만원)



< 야외쉼터(강서생태공원) >



< 자연생태 학습장(여의도샛강) >

□ 추진경과

- '24. 4.~12. : 강서·여의도샛강 생태공원 재정비 실시설계 완료
 - 설계비 : 300백만원(강서 150, 여의도샛강 150)
- '25. 3. : 난지·암사 생태공원 실시설계 착수('25. 11. 설계완료)
 - 설계비 : 300백만원(난지 150, 암사 150) ※재정비공사 : '26년 시행

□ 향후계획

- '25. 4.~ : 강서·여의도샛강 생태공원 재정비 공사
 - 공 사 비 : 40억원(강서 20억, 여의도샛강 20억)
 - 여의도샛강 착공 : '25. 4.1., 강서 착공 : '25. 5.2.

2

중랑천 놀빛광장 조성

한강·지천 합류부에 자연·문화·힐링이 어우러지는 광장을 조성하여 국내·외 관광객이 찾는 명소로 활용하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑천 합류부(성동구 옥수동 493-1 일대)
- 공사기간 : '24. 7. ~ '25. 5.
- 사 업 비 : 1,570백만원(설계 130, 공사 1,440)
- 시설구상 : 놀빛 전망대, 전망 파고라, 잔디 스탠드, 생태둑방 등
- 주요내용 : 그레이트 한강프로젝트 일환 한강 매력적인 감성공간 조성



<놀빛광장 조감도>



< 잔디 스탠드 >



< 놀빛 전망대 >



< 전망 파고라 >

□ 추진현황

- '24. 2. : 기본 및 실시설계 완료
- '24. 4. : 하천점용허가 완료
- '24. 12. : 놀빛 전망대 설치
- '25. 3. : 잔디 스탠드 및 전망 파고라 설치

□ 향후계획

- '25. 4. : 식재공사 및 가도(임시도로) 복구
- '25. 5. : 중랑천 합류부 놀빛광장 조성 완료

작 성 자

한강여가사업부장: 이주영 ☎ 3780-0868 자연성회복과장: 이무림 ☎ 0834 담당: 송하연 ☎ 0835

3

한강 맨발걷기길 조성·운영

한강공원 맨발걷기 흙길에 대한 요구 증가로 황톳길 조성을 통해 한강공원 이용 만족도 향상에 기여하고자 함

□ 추진방향

- 한강 방문객 이용형태를 반영하여 순환산책, 편의·휴게 시설 도입
- 자연발생 산책로를 맨발걷기 편한 환경으로 개선하여 이용 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 잠원한강공원 신사나들목 주변
- 사업규모 : 맨발걷기 흙길 190m, 면적 2,200㎡
- 사업기간 : '25. 1. ~ 11.
- 사업내용 : 황톳길 조성, 세족장 및 편의·휴게시설 도입
- 총사업비 : 200백만원(설계비 20백만원, 공사비 등 180백만원)

□ 추진현황

- '25. 2. : 현장조사 및 추진계획 수립
- '25. 3. : 실시설계 용역 착수 및 중간보고



< 현황사진 >



< 황톳길 기본구상도 >

□ 향후계획

- '25. 5. : 실시설계 완료
- '25. 7.~11. : 공사시행 및 유지관리

4

안양천교 자전거도로 구조 개선

노후되고(안전등급 “D”) 폭이 좁은 안양천 기존 교량을 철거하고 확대 신설하여 이용 시민의 안전사고 예방과 보행 편의를 증대하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 강서구 염창동 ~ 영등포구 양화동(안양천 합류부)
- 내 용 : (신설) 폭 9.5m, 연장 180m (기존철거) 폭 6m, 연장 200m
- 기 간 : '23. 10. 10. ~ '26. 2. 25. ※ 기존교량 : 연속 리멘교(3중시설, '83년 준공)
- 총사업비 : 12,969백만원(시설비 10,877, 설계비 612, 감리비 1,480)



□ 세부 내용

- (교량형식) **합성형 리멘교** (전체폭 9.5m, 자전거도로 4m, 보행로 3m, 중앙 분리 및 여유폭 25m)
- (선형계획) 경제성 및 안전성을 고려한 교량 상하류 회전교차로 설치

□ 추진현황 (공정률:80%)

- '23. 10.~'24. 12. : 1차 (하류) 교량 180m 중 115m 신설 완료
- '24. 10.~'25. 4. : 2차 (상류) **잔여구간 65m 시공중**
 - 하부공 : 가도 설치 및 교각 3개(현장타설말뚝 6개) 시공완료
 - 상부공 : 상판 철근조립 및 콘크리트 타설 완료 (4.10)

□ 향후계획

- '25. 5.~6. : 주변도로 포장, 조경식재 및 개통
- '25. 9.~12. : 기존 노후교량 철거

4. 시민 접근성 안전 강화

① 암사초록길 시민 개통

② 보광나들목 리모델링

③ 수상안전시설 정비 · 보강

④ 한강 폐기물 매일 반출로 쾌적한 환경조성

1

암사초록길 시민 개통

한강공원과 선사유적지를 잇는 녹지 축인 암사초록길 조성을 완료하고 4월 중 시민들에게 개방하여 한강공원 접근성을 개선하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 강동구 암사동 164일대(광나루한강공원~서울암사동유적)
- 사업규모 : 지하차도 상부 초록길 및 녹지 조성(6,300㎡)
 - 지하차도 건설 : 왕복 8차로, 길이 50m
 - 올림픽대로 종단선형 조정 : 김포방향 840m, 하남방향 680m
- 사업기간 : '11. 2. ~ '25. 3.
- 총사업비 : 423억(설계 16, 감리 32, 공사 375)
- 위치도 및 전경사진



< 위치도 >



< 전경사진 >

□ 추진현황

- '24. 10. : 김포, 하남방향 지하차도 완전 개통
- '24. 12. : 지하차도 횡배수관 및 펌프장 설치
- '25. 2. : 초록길 상부 조경 및 연결도로 조성(강동구 주관)
- '25. 3. : 제방 축조(약 600m) 및 호안블럭 설치

□ 향후계획

- '25. 4. : 시민개방
- '25. 6. : 개통식(별도 검토 예정)

2

보광나들목 리모델링

한강공원 이용시민의 보행환경 개선과 보행약자를 위한 승강기 신규 설치로 접근성을 개선하여 시민에게 쾌적한 나들목 이용환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 사업명 : 보광나들목 리모델링 공사
- 사업기간 : '24. 3. ~ '25. 4.
- 사업비 : 1,500백만원
- 공사내용 : 엘리베이터 설치 및 나들목 내외부 환경개선 등
 - (구조물) 나들목 내·외부 환경개선 및 엘리베이터 신규 설치
 - (전기·통신) 나들목 내·외부 조도개선(조명등 20개소 → 34개소, 38-50W) 및 CCTV 설치



< 승강기 공사 전 >



< 승강기 공사 후 >



< 내부통로 개선 전 >



< 내부통로 개선 후 >

□ 추진현황

- '24. 3. : 공사 착공
- '24. 4.~'25. 3. : 나들목 내·외부 환경개선 및 승강기 설치 완료
- '25. 4. : 나들목 개통

작성자

시설부장 : 이유국 ☎ 3780-0830 치수과장 : 최연섭 ☎ 0682 담당 : 이은찬 ☎ 0651

3

수상안전시설 정비·보강

한강버스 등 수상 관련 현안사업 추진 및 수상 여가수요 증가가 예상됨에 따라 수상안전시설을 정비·보강하여 안전한 수상 환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업목적 : 한강버스 등 운항 선박 및 수상레저활동 이용객의 안전사고 예방
- 사업기간 : '24. 12. ~ '25. 10.
- 총사업비 : 금4,081백만원(본예산: 2,196백만원, 사고이월('24년): 1,885백만원)

< 수상안전시설 사업 >

구 분	수상레저활동 안내표지	너울피해 방지장치	교량충돌 방지표지	시설항로표지 이·증설	지능형 수상 안전관리 시스템
주요내용	수상레저활동 집중구역 구분	선박운항으로 인한 너울피해방지	교각 시인성 확보	선박 통행 가능 경간 안내	수상상황 실시간모니터링
사업위치	뚝섬,망원 2개소	뚝섬 1개소	17개 교량(96)	(이설)7개 교량(84) (증설)2개 교량(18)	15개 교량(172)
사업비	44백만원	47백만원	1,042백만원	752백만원	2,196백만원
설치완료	'25.4월	'25.4월	'25.5월	'25.6월	'25.10월



<잠수교 수위 표시장치>



<교량충돌방지 안내표지>



<지능형 안전관리 시스템>

※ '24.11.18. : 잠수교 수위 표시장치 구축 완료

□ 향후계획

- '25. 10. : 지능형 수상안전관리시스템 구축
 - 주요내용 : 실시간 모니터링 통한 수상상황 대응
 - 사업규모 : 한강버스 통행 15개 교량 CCTV 172대 및 상황실 구축
- ※ 지능형 수상안전관리시스템 구축 위한 기본설계 완료('25. 4.)

작성 자 | 한강여가사업부장: 이주영 ☎ 3780-0868 수상관리과장: 이성희 ☎0816 담당: 안종필 ☎0821

4

한강 폐기물 매일 반출로 쾌적한 환경 조성

한강공원 내 발생하는 폐기물을 신속히 수거 및 당일 반출하여 쓰레기 적치 없는 쾌적한 한강공원을 시민들에게 제공하고자 함

□ 사업개요

- 청소범위 : 11개 공원 둔치 · 호안가(화장실 138동 포함)
- 청소인력 및 장비
 - 청소인력(198명) : 안내센터 164, 본부 소속 34 (’25. 3월)

구 분		계	광나루	잠실	뚝섬	잠원	반포	이촌	여의도	양화	난지	망원	강서	환경수질과
둔 치	공무직	80	5	6	9	6	6	6	12	5	5	5	5	10
	기간제	70	3	5	7	4	7	5	11	3	2	3	2	18
수 상	공무직	40	4	-	4	4	-	5	-	5	5	5	2	6
	기간제	8	4	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-

※ 기간제 청소인력은 매년 채용·운영(3.1.~11.15.)

- 차량장비(86대) : 집게차 5, 암롤트럭 2, 다목적운반차 79

□ 추진현황

- 폐기물 반출시스템 구축 운영
 - 11개 센터의 수거 폐기물을 수거차량이 당일 난지통합적환장으로 반출
 - 난지적환장 내 장기 적치 없도록 폐기물 반출 횟수 증대(주1회→주3회)
- 대규모 행사 시 행사주최자에게 발생 폐기물 처리 의무 부여
- 야간 취약시간대(23시~익일 07시) 청소인력(청소전문업체) 추가 투입
 - 여의도 봄꽃축제·어린이날·열대야, 국제정원박람회 총 327명 투입

< '24년 한강공원 폐기물 처리 실적 >

(단위: 톤)					
구 분	계	소 각	파 쇠	음식물	재활용품
처 리 량	3,184	352	2,371	111	350

□ 향후계획

- '25. 4.~ : 봄축제(여의도벚꽃축제 등) 개최 시 주최측의 폐기물 처리 의무부여 및 주말 심야시간 중 청소 인력 투입
